

社会資本総合整備計画 事後評価書

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|----|---|----|---|---|---|-----------|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 島本町下水道施設改築計画 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | | |
| 交付対象 | 島本町 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道ストックマネジメント計画に基づき、適正な施設の改築を図る。 | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | | 87 | A | 87 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H31 当初) | 中間目標値 (R2 当初) | 最終目標値 (R5 末) |
| 1 | マンホール蓋替率を0%(H31)から100%(R5)に増加させる マンホール蓋替え率(%) 計画期間内蓋替え基数(基) / 要蓋替え基数(基) 100基 / 100基 | 0% | 50% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|---------|---------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|--------------------|------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H31 | R02 | R03 | R04 | R05 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 島本町 | 直接 | 島本町長 | 管渠(汚水) | 改築 | 下水道施設改築事業 | マンホール蓋替 100基 計画策定一式 | 島本町 | | | | | | 87 | - | 策定済 | |
| | | 下水道ストックマネジメント計画(マンホール蓋)策定済。種別1は外に管渠(雨水)及びポンプ場合む。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 87 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


事後評価

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 定量的指標の達成状況や事業効果の発現状況を学識経験者等の第三者から構成される委員会に意見具申を受け検証した。 | 令和8年2月 |
| | 公表の方法 本町ホームページ |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ストックマネジメント計画（マンホール蓋）に基づくマンホール蓋替を100基行い、適正な下水道施設の維持管理に努めた。 ・ストックマネジメント計画（ポンプ場・管路施設）の作成を行い、適正な下水道施設の維持管理を図る。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| <p>・本計画事業について、令和3年度以降、整備計画「島本町安全で安心できるまちづくり（その3）（防災・安全）」に引継ぎ、マンホール蓋替工事を継続することで、適正な施設の維持管理に取り組んだ。また、作成したストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場及び下水道管路施設の適正な維持管理を図った。</p> | |

案件番号：

| 目標値の達成状況 | | | |
|----------|-----------|----------------|------|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 最終 目標値 | 100% | 目標達成 |
| | 最終 実績値 | 100% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(参考様式3)

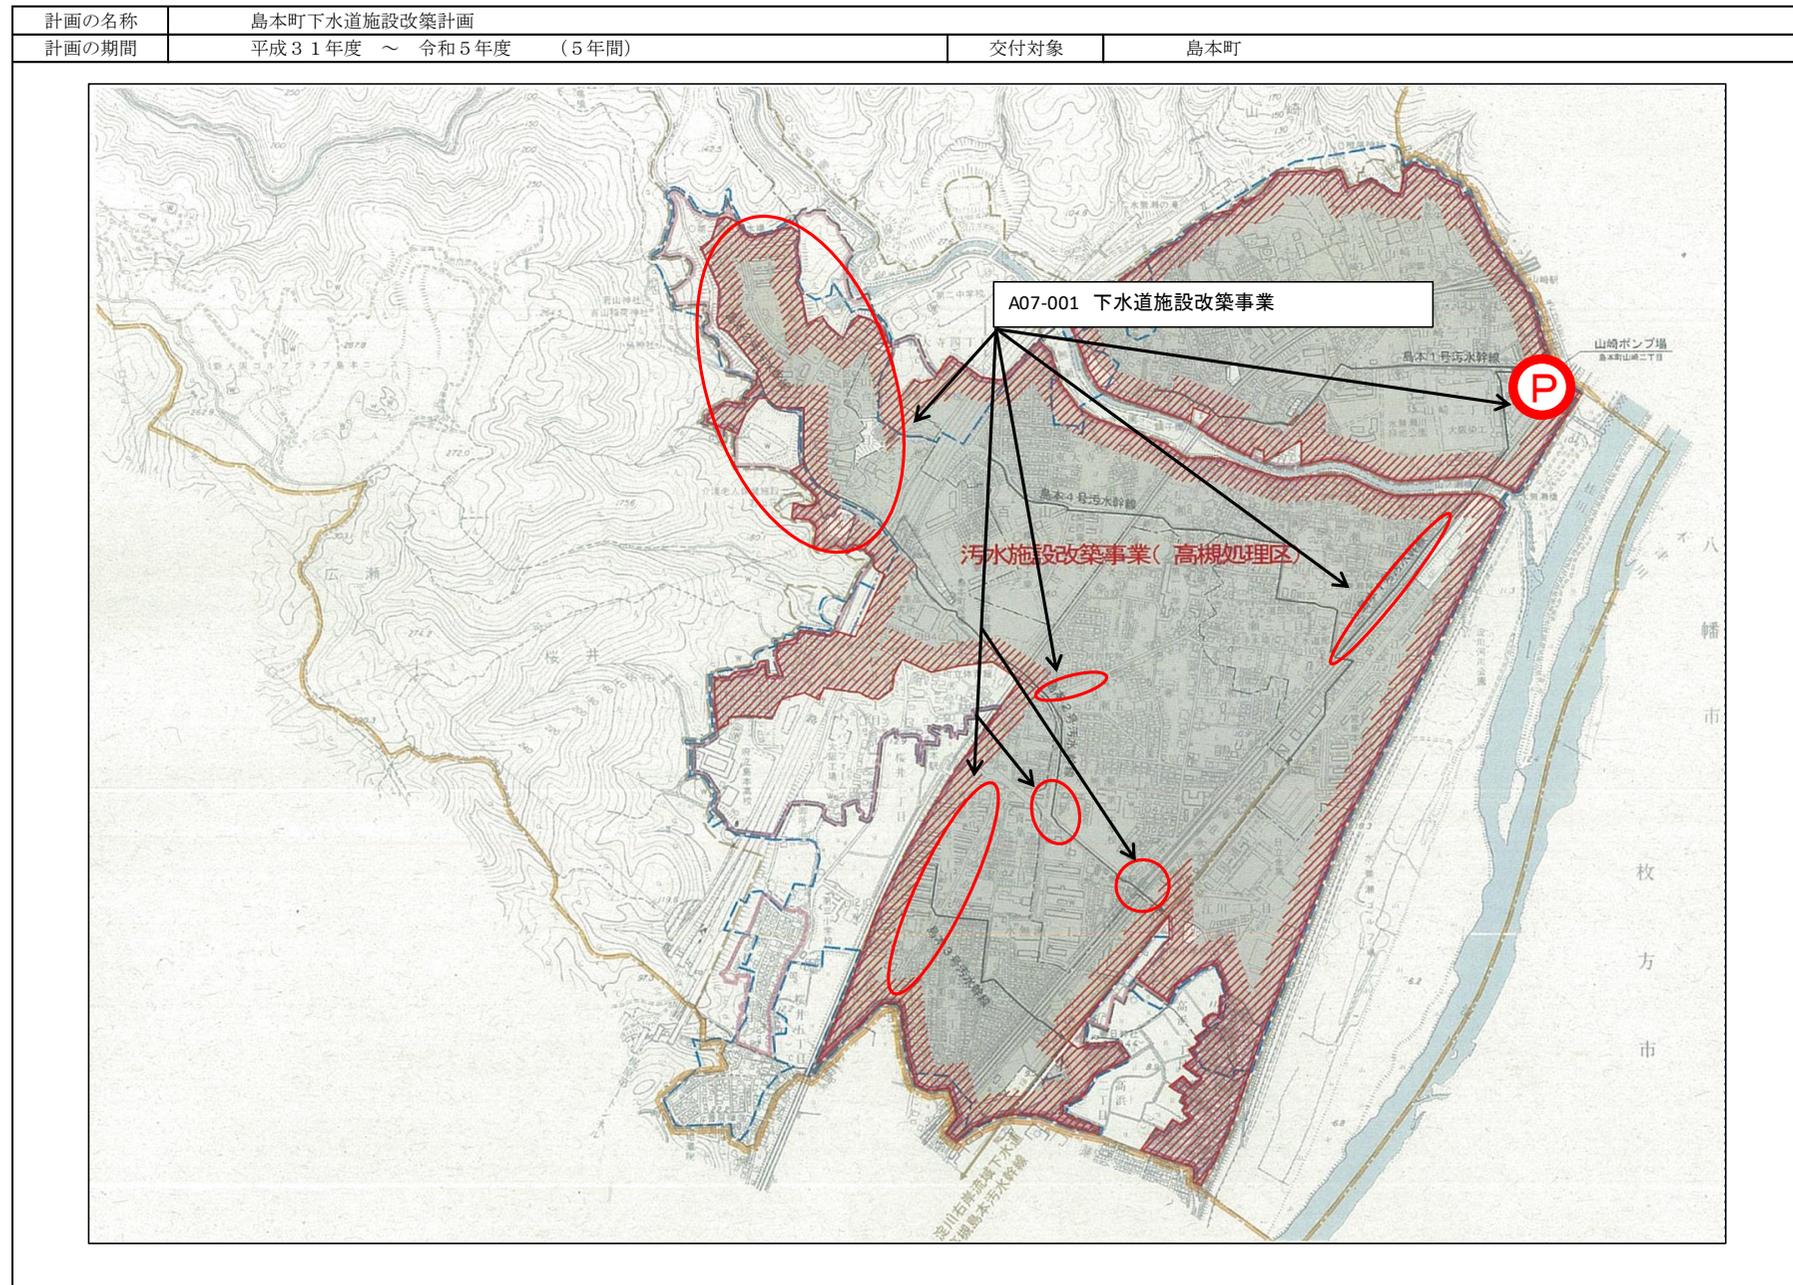

| 計画の名称 | 計画の期間 |
|--------------|-------------------|
| 島本町下水道施設改築計画 | 平成31年度～令和5年度(5年間) |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 計画の成果目標(定量的指標) | ①マンホール蓋替率を0%(H31)から100%(R5)に増加させる |
| 定量的指標の定義及び算定式 | ①マンホール蓋替率(%) 計画期間内蓋替え基数(基)÷要蓋替え基数(基) 100基/100基 |

(1) 事業費の執行状況 (単位:百万円)

| | 計画値 | 実績値 | 平成31年度 | 令和2年度 | 執行率 |
|------------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | (%) |
| 全体事業費 | 28 | 27.99 | 13.56 | 14.43 | 99.9% |
| ① | 基幹事業費 | 28 | 13.56 | 14.43 | 99.9% |
| | 関連社会資本整備費 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 効果促進事業費 | 0 | 0 | 0 | - |
| 効果促進事業費の割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |

※国土交通省による交付金制度の見直しにより、令和3年度事業より島本町安全で安心できるまちづくり(その3)(防災・安全)に移行したため、平成31年度、令和2年度の計画値、実績値とした。

(2) 施設整備の進捗状況及び定量的指標の達成状況

① マンホール取替数 (単位:個)

| | 計画値 | 実績値 | 平成31年度 | 令和2年度 | 執行率 |
|-----------|-----|-----|--------|-------|-----|
| | | | | | (%) |
| マンホール蓋取替数 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |

本計画において、老朽化しているマンホール蓋を平成30年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、取替工事を行うことで、適正な下水道施設の維持管理を図るものである。

ストックマネジメント計画(マンホール蓋)では、平成31年度から令和5年度の期間に、245基のマンホール蓋を改築する予定をしており、本計画後の残りのマンホール蓋の改築については、『島本町安全で安心できるまちづくり(その3)(防災・安全)』(R3～R6)の事業内容として引き続き取り組んでいる。

マンホール蓋取替位置図



①公共下水道マンホール蓋取替工事

施工前



施工後

